

EPSI PoI Userclub – Workshop

État d'avancement du développement ePOL et perspectives

03.11.26 | Abraxas Informatik AG

Sommaire

1.	Nouvelle application – Présentation générale	2 Min.
2.	Projet ePOL - Présentation de la démarche et de la méthodologie	2 Min.
3.	Projet ePOL - Développement réalisés	3 Min.
4.	Projet ePOL - Développement en cours	11-15 Min.
5.	Projet ePOL - Développement planifiés	3 Min.
6.	Questions et échanges	5 Min.

Projet « ePOL »
EPSI Pol devient une solution web

plus intuitive

basée sur le web




testable

pérenne

Nouvelle application – Principales évolutions
Qu’elles sont les nouveautés ?

- Refonte de l'interface utilisateur selon les standards Abraxas
- Remplacement du framework Uniface par .NET
- Adoption de nouvelles technologies, permettant l'intégration de nouvelles fonctionnalités
- Choix libre du système de gestion de base de données (condition : base de données relationnelle)
- Maintien des fonctionnalités existantes pertinentes

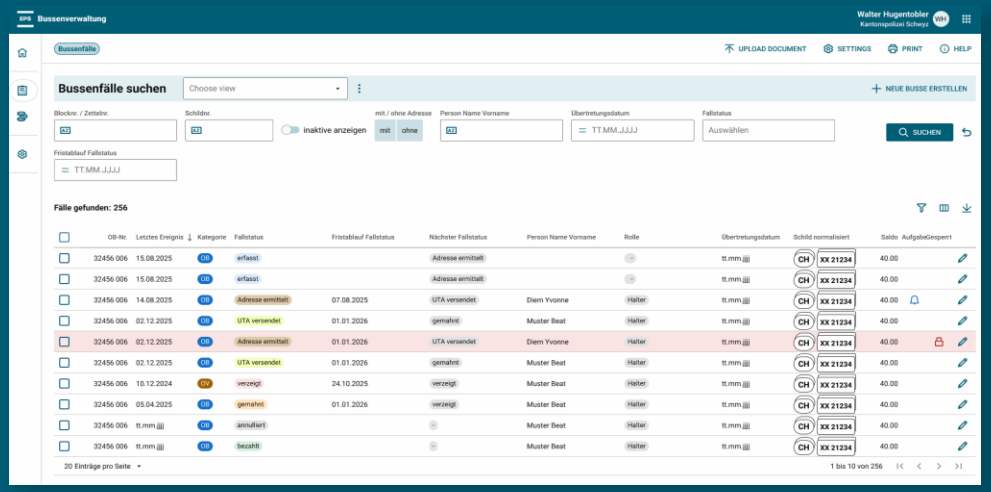

- Remboursements automatiques
- Letter ID
- Interventions prioritaires
- Etc...

Etat d'avancement du projet

4

Mise en service et déploiement

Mettre à disposition un environnement pour les tests cli
Mise en service selon le plan de déploiement
Formation du personnel

3

Réalisation côté Abraxas

Démonstration en direct : aperçu d'ePOL
Développement de l'application
Intégration des retours

Réalisation côté client

Phase de test des cas d'usage
Retours du client ensuite pris en compte et intégrés

2

Conception

Premières ébauches / Création du prototype ePOL / Spécifications
Planification et mise en place du système de test

1

Initialisation

Situation actuelle / Analyse
Organisation des équipes et des tâches



Démarche du projet

Développement déjà mis en oeuvre



4

Mise en service et déploiement

Mettre à disposition un environnement pour les tests clients
Mise en service selon le plan de déploiement
Formation du personnel

3

Réalisation côté Abraxas

Démonstration en direct : aperçu d'ePOL
Développement de l'application
Intégration des retours

Réalisation côté client

Phase de test des cas d'usage
Retours du client ensuite pris en compte et intégrés.

2

Conception


Premières ébauches / Création du prototype ePOL / Spécifications
Planification et mise en place du système de test

1


Initialisation

Situation actuelle / Analyse
Organisation des équipes et des tâches

Situation actuelle

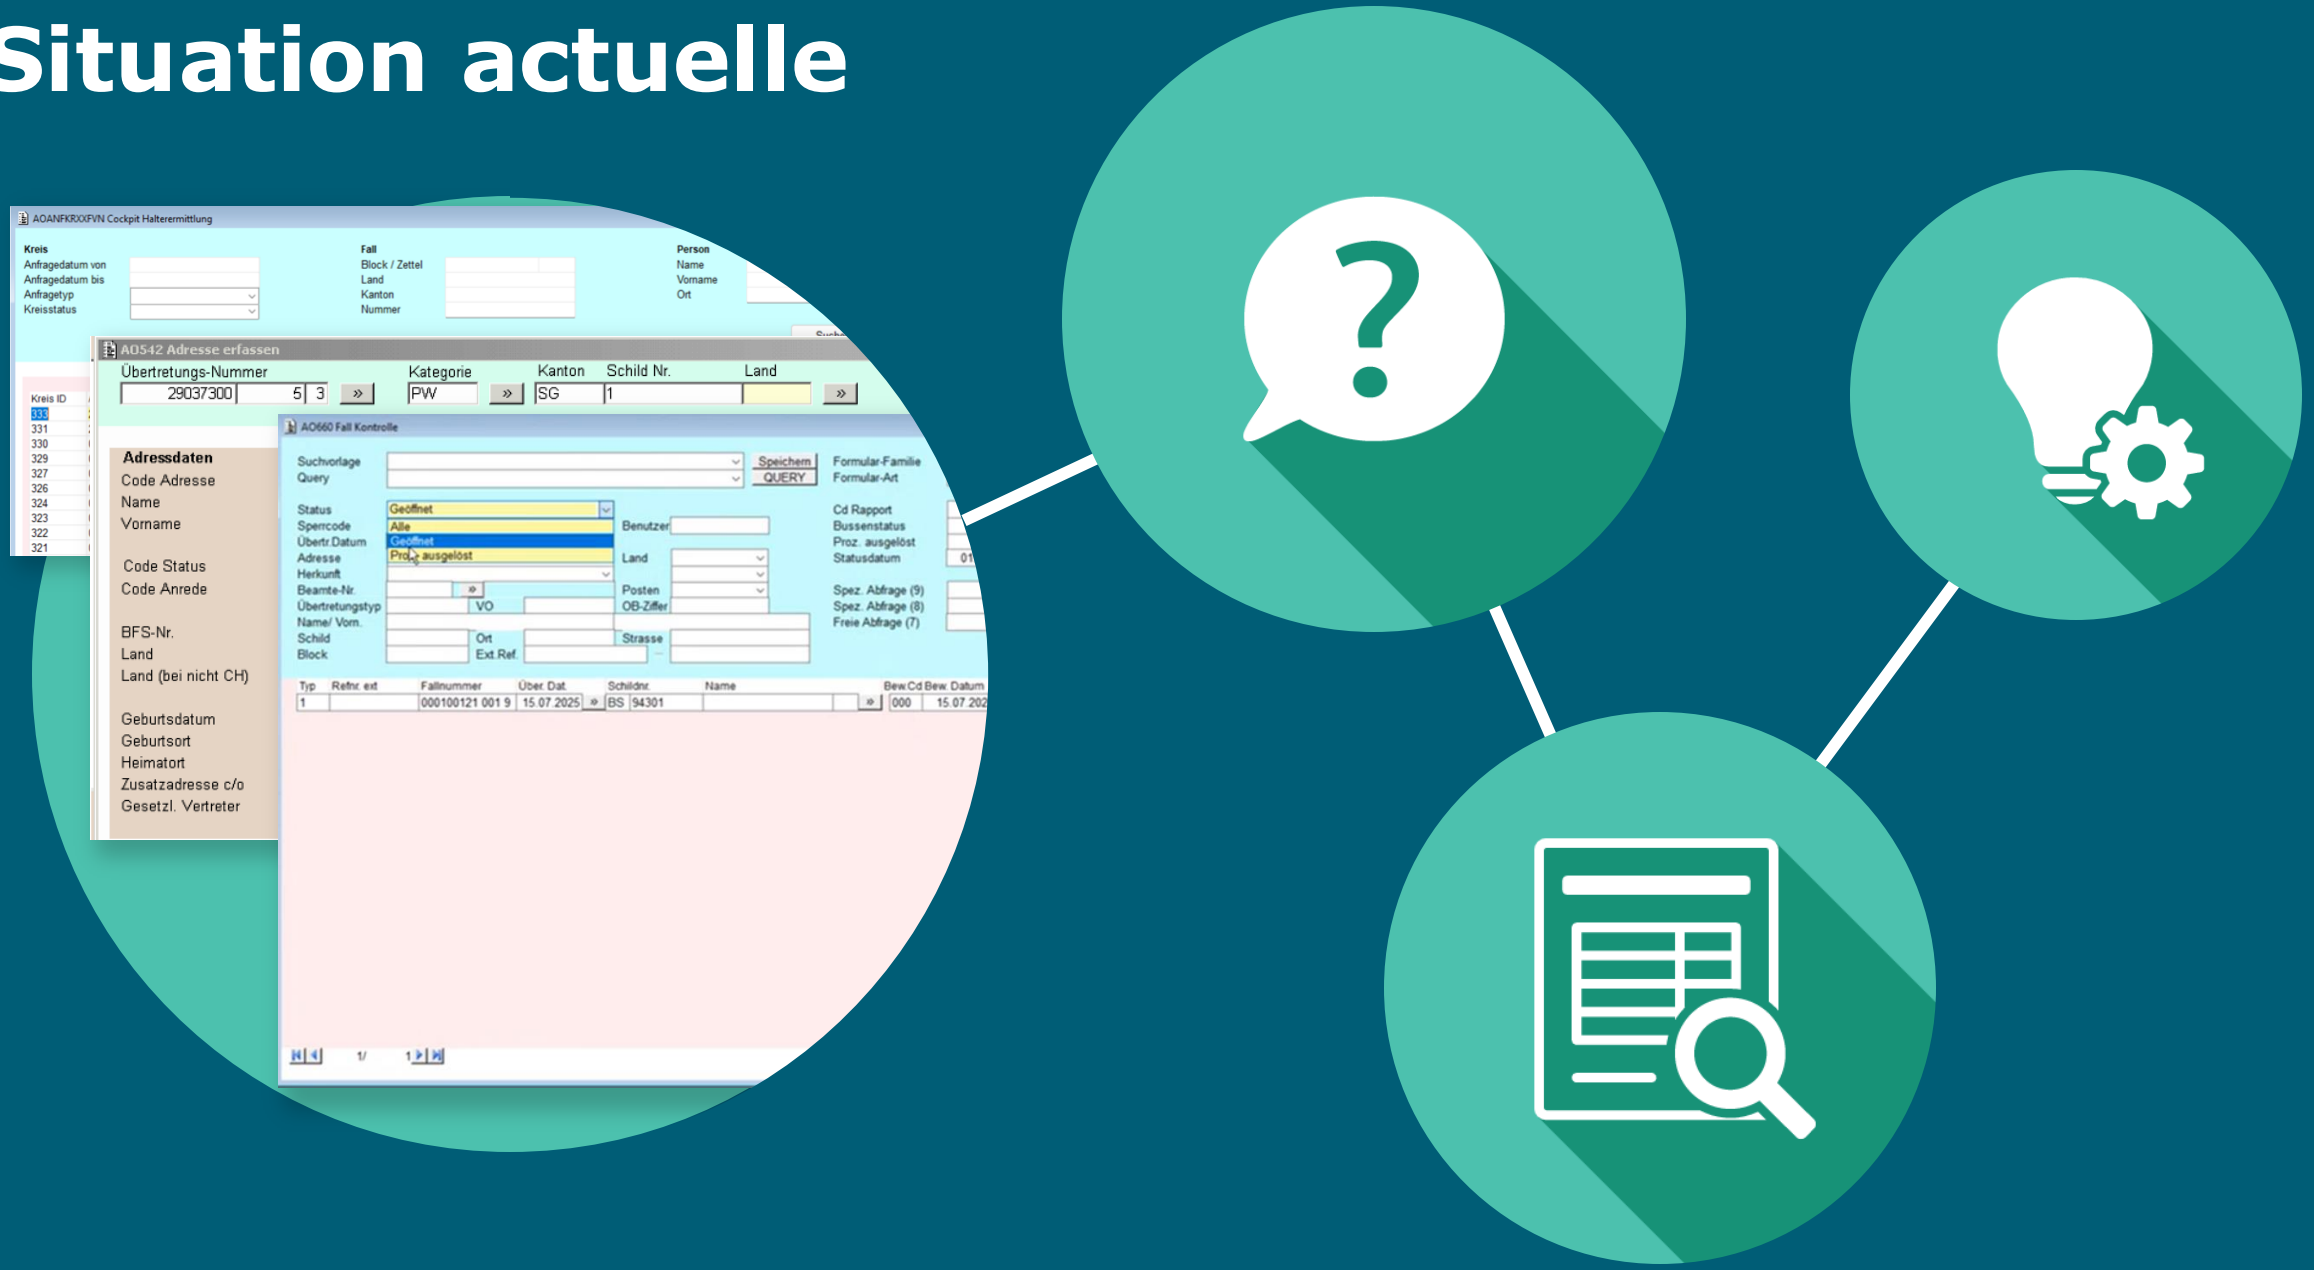

Organisation : Tâches

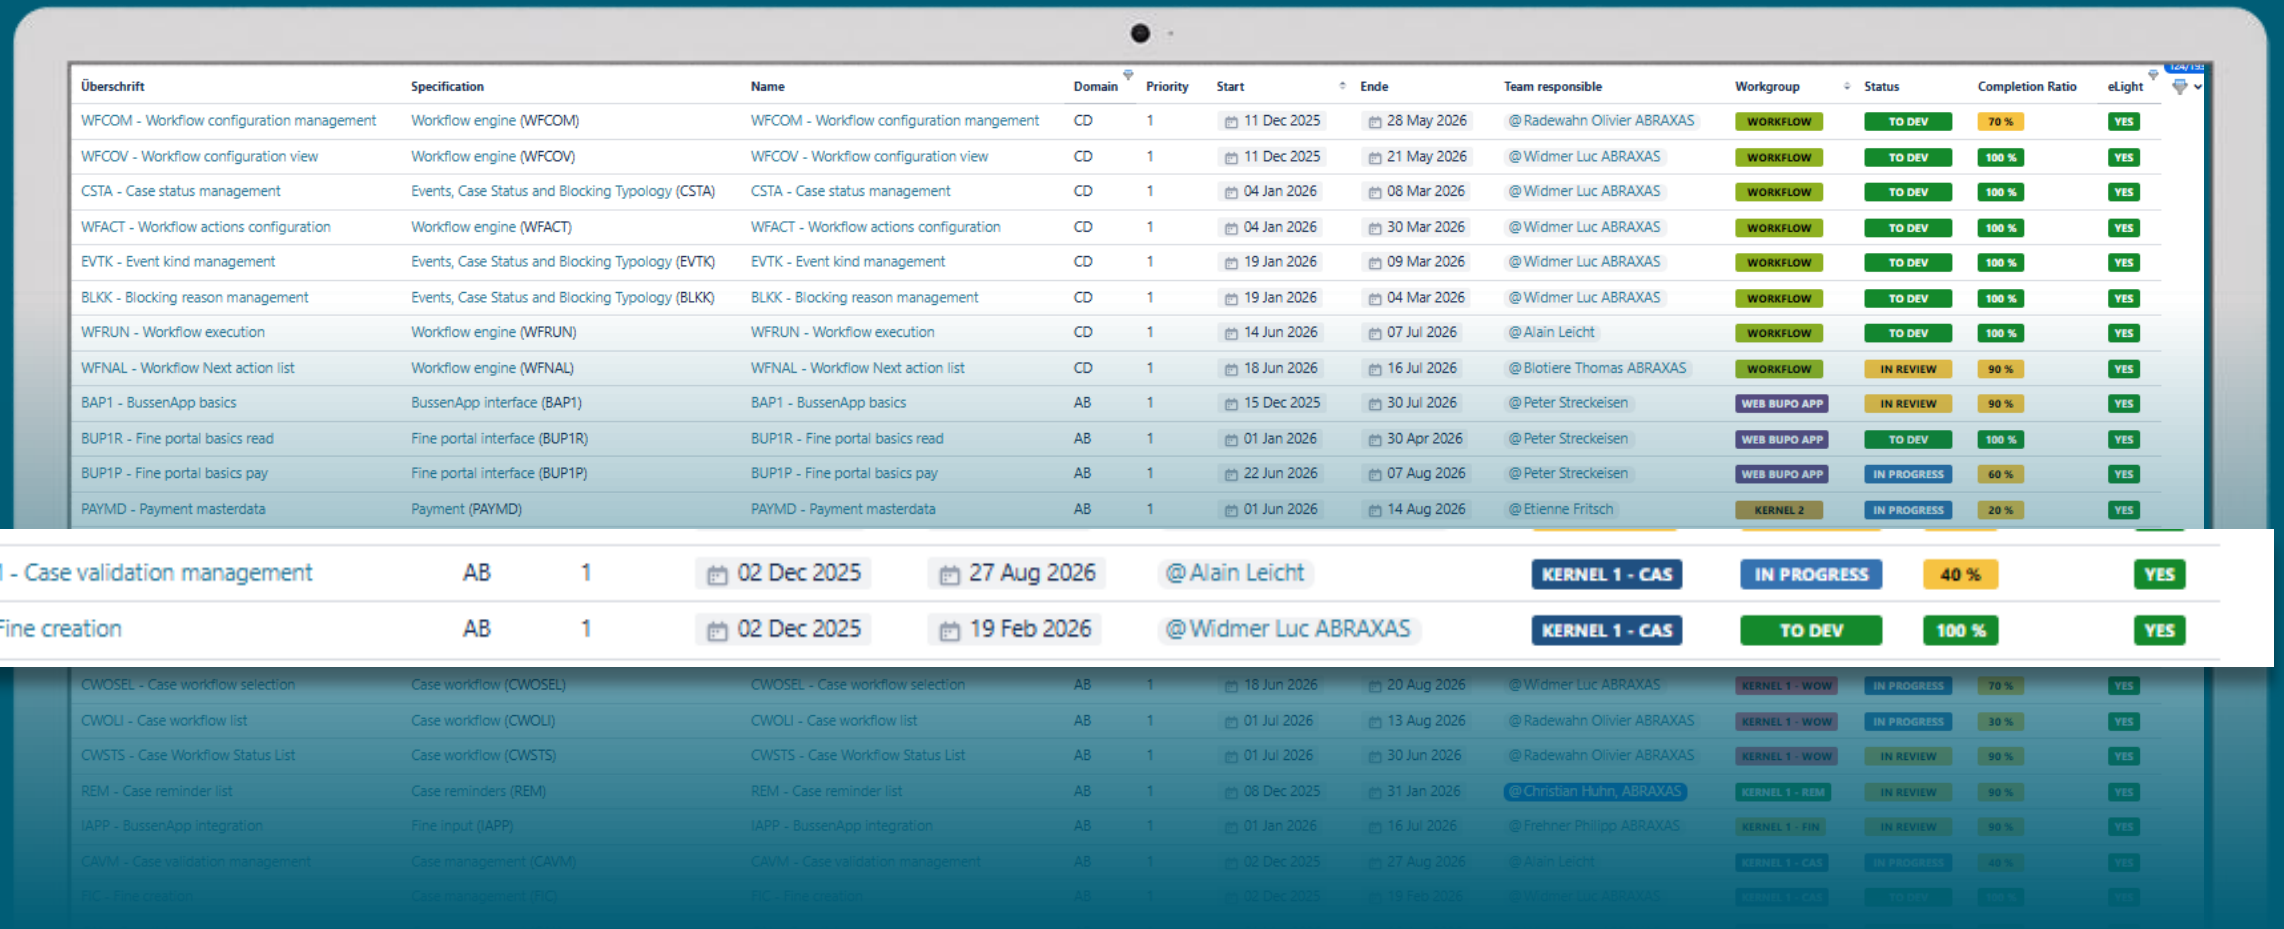

Überschrift	Specification	Name	Domain	Priority	Start	Ende	Team responsible	Workgroup	Status	Completion Ratio	eLight
WFCOM - Workflow configuration management	Workflow engine (WFCOM)	WFCOM - Workflow configuration mangement	CD	1	11 Dec 2025	28 May 2026	@Radewahn Olivier ABRAXAS	WORKFLOW	TO DEV	70 %	YES
WFCOV - Workflow configuration view	Workflow engine (WFCOV)	WFCOV - Workflow configuration view	CD	1	11 Dec 2025	21 May 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	WORKFLOW	TO DEV	100 %	YES
CSTA - Case status management	Events, Case Status and Blocking Typology (CSTA)	CSTA - Case status management	CD	1	04 Jan 2026	08 Mar 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	WORKFLOW	TO DEV	100 %	YES
WFACT - Workflow actions configuration	Workflow engine (WFACT)	WFACT - Workflow actions configuration	CD	1	04 Jan 2026	30 Mar 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	WORKFLOW	TO DEV	100 %	YES
EVTK - Event kind management	Events, Case Status and Blocking Typology (EVTK)	EVTK - Event kind management	CD	1	19 Jan 2026	09 Mar 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	WORKFLOW	TO DEV	100 %	YES
BLKK - Blocking reason management	Events, Case Status and Blocking Typology (BLKK)	BLKK - Blocking reason management	CD	1	19 Jan 2026	04 Mar 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	WORKFLOW	TO DEV	100 %	YES
WFRUN - Workflow execution	Workflow engine (WFRUN)	WFRUN - Workflow execution	CD	1	14 Jun 2026	07 Jul 2026	@Alain Leicht	WORKFLOW	TO DEV	100 %	YES
WFNAL - Workflow Next action list	Workflow engine (WFNAL)	WFNAL - Workflow Next action list	CD	1	18 Jun 2026	16 Jul 2026	@Blotiere Thomas ABRAXAS	WORKFLOW	IN REVIEW	90 %	YES
BAP1 - BussenApp basics	BussenApp interface (BAP1)	BAP1 - BussenApp basics	AB	1	15 Dec 2025	30 Jul 2026	@Peter Streckeisen	WEB BUPO APP	IN REVIEW	90 %	YES
BUP1R - Fine portal basics read	Fine portal interface (BUP1R)	BUP1R - Fine portal basics read	AB	1	01 Jan 2026	30 Apr 2026	@Peter Streckeisen	WEB BUPO APP	TO DEV	100 %	YES
BUP1P - Fine portal basics pay	Fine portal interface (BUP1P)	BUP1P - Fine portal basics pay	AB	1	22 Jun 2026	07 Aug 2026	@Peter Streckeisen	WEB BUPO APP	IN PROGRESS	60 %	YES
PAYMD - Payment masterdata	Payment (PAYMD)	PAYMD - Payment masterdata	AB	1	01 Jun 2026	14 Aug 2026	@Etienne Fritsch	KERNEL 2	IN PROGRESS	20 %	YES
CAVM - Case validation management	AB	1	02 Dec 2025	27 Aug 2026	@Alain Leicht	KERNEL 1 - CAS	IN PROGRESS	40 %	YES		
FIC - Fine creation	AB	1	02 Dec 2025	19 Feb 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	KERNEL 1 - CAS	TO DEV	100 %	YES		
CWOSEL - Case workflow selection	Case workflow (CWOSEL)	CWOSEL - Case workflow selection	AB	1	18 Jun 2026	20 Aug 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	KERNEL 1 - WOW	IN PROGRESS	70 %	YES
CWOLI - Case workflow list	Case workflow (CWOLI)	CWOLI - Case workflow list	AB	1	01 Jul 2026	13 Aug 2026	@Radewahn Olivier ABRAXAS	KERNEL 1 - WOW	IN PROGRESS	30 %	YES
CWSTS - Case Workflow Status List	Case workflow (CWSTS)	CWSTS - Case Workflow Status List	AB	1	01 Jul 2026	30 Jun 2026	@Radewahn Olivier ABRAXAS	KERNEL 1 - WOW	IN REVIEW	90 %	YES
REM - Case reminder list	Case reminders (REM)	REM - Case reminder list	AB	1	08 Dec 2025	31 Jan 2026	@Christian Huhn, ABRAXAS	KERNEL 1 - REM	IN REVIEW	90 %	YES
IAPP - BussenApp integration	Fine input (IAPP)	IAPP - BussenApp integration	AB	1	01 Jan 2026	16 Jul 2026	@Frehner Philipp ABRAXAS	KERNEL 1 - FIN	IN REVIEW	90 %	YES
CAVM - Case validation management	Case management (CAVM)	CAVM - Case validation management	AB	1	02 Dec 2025	27 Aug 2026	@Alain Leicht	KERNEL 1 - CAS	IN PROGRESS	40 %	YES
FIC - Fine creation	Case management (FIC)	FIC - Fine creation	AB	1	02 Dec 2025	19 Feb 2026	@Widmer Luc ABRAXAS	KERNEL 1 - CAS	TO DEV	100 %	YES

Démarche du projet

Développement réalisé en grande partie



4

Mise en service et déploiement

Mettre à disposition un environnement pour les tests client
Mise en service selon le plan de déploiement
Formation du personnel

3

Réalisation côté Abraxas

Démonstration en direct : aperçu d'ePOL
Développement de l'application
Intégration des retours

Réalisation côté client

Phase de test des cas d'usage
Retour du client ensuite pris en compte et intégré

2

Conception


Premières ébauches / Création du prototype ePOL / Spécifications
Planification et mise en place du système de test

1


Initialisation

Situation actuelle / Analyse
Organisation des équipes et des tâches


Prototype

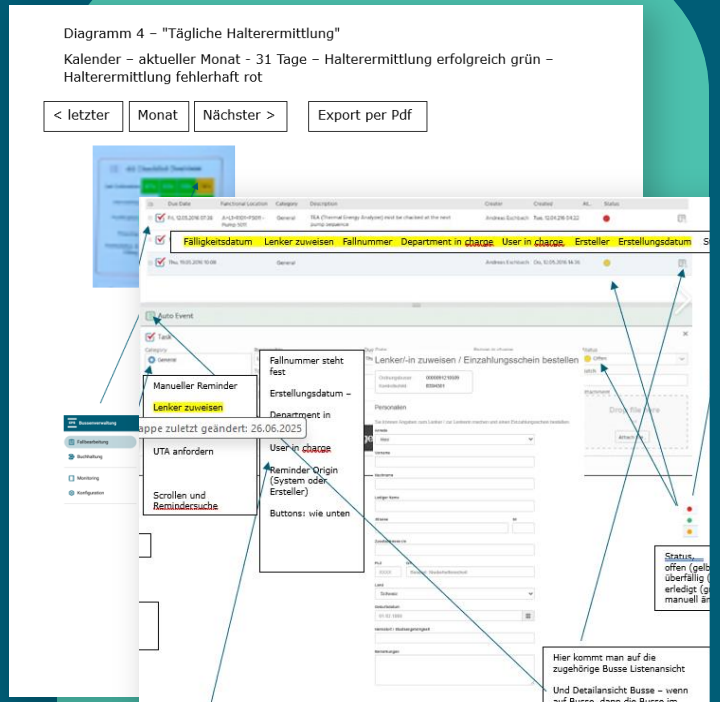

Premières ébauches

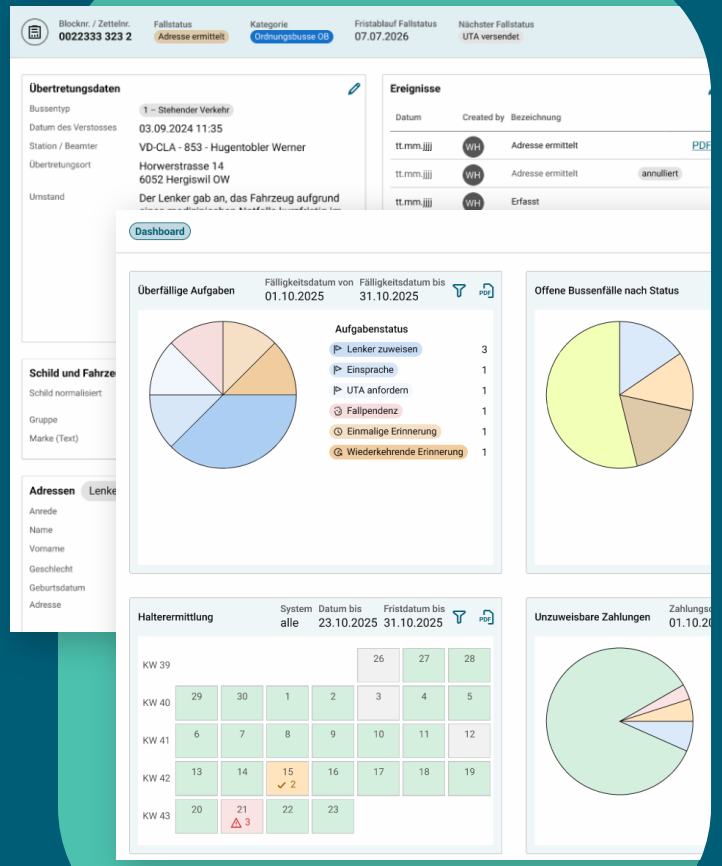



Prototype

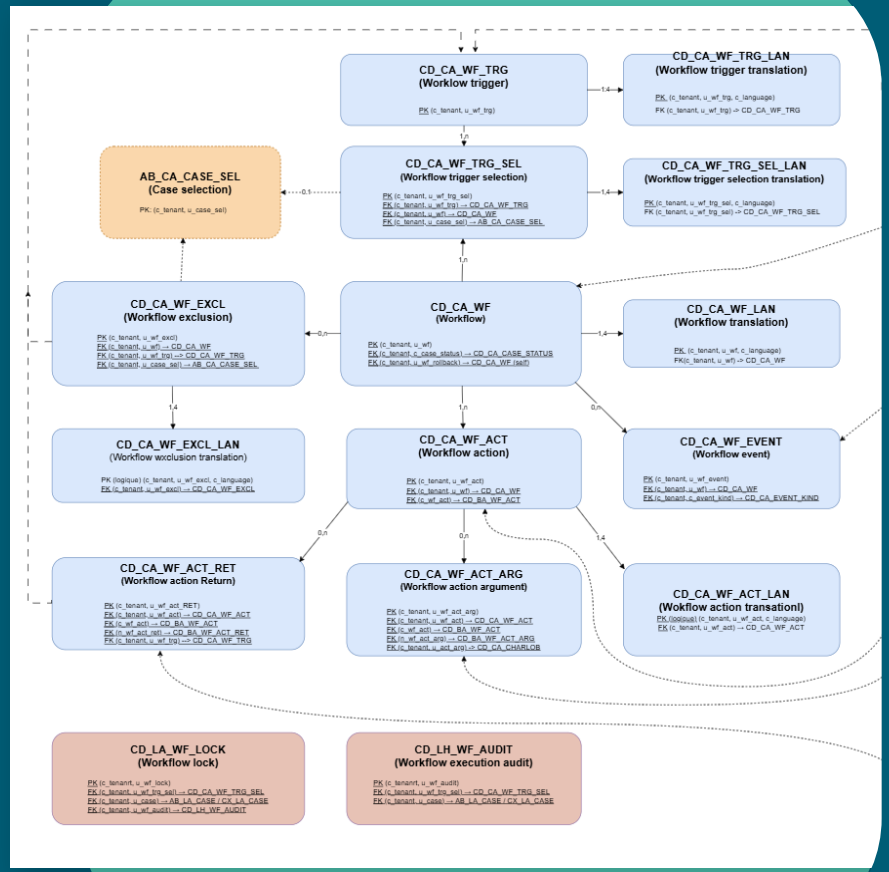


Spécifications

Planification et mise en place du système de test

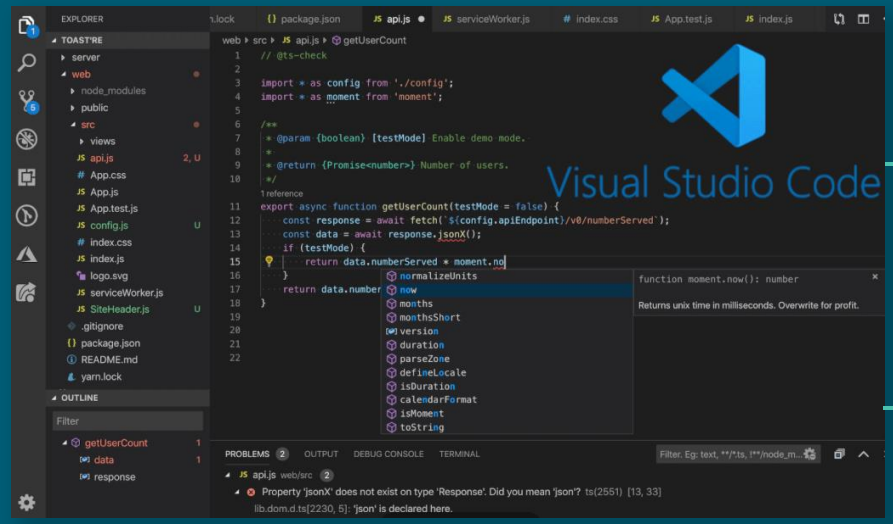

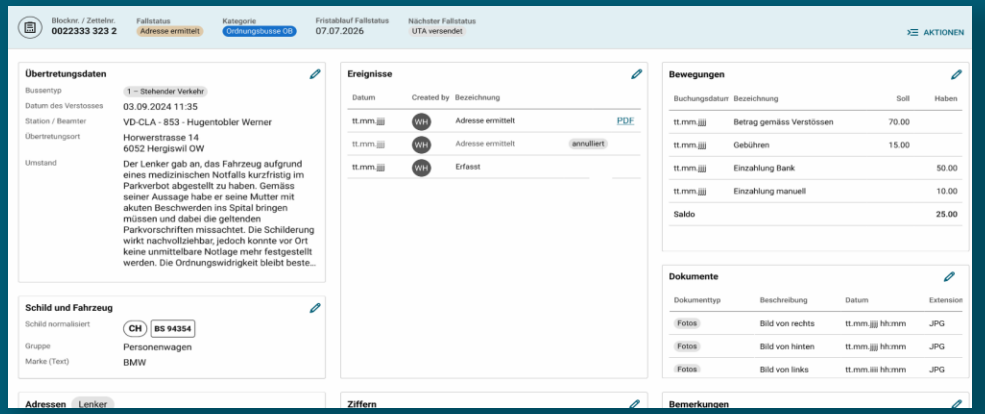



Démarche du projet

Développement en cours

4

Mise en service et déploiement

Mettre à disposition un environnement pour les tests client
Mise en service selon le plan de déploiement
Formation du personnel

3

Réalisation côté Abraxas

Démonstration en direct : aperçu d'ePOL
Développement de l'application
Intégration des retours

Réalisation côté client

Phase de test des cas d'usage
Retour du client ensuite pris en compte et intégré

2

Conception

Premières ébauches / Création du prototype ePOL / Spécifications
Planification et mise en place du système de test

1


Initialisation

Situation actuelle / Analyse
Organisation des équipes et des tâches


Démonstration en direct :
aperçu d’ePOL

abraxas

Developpement de l'application

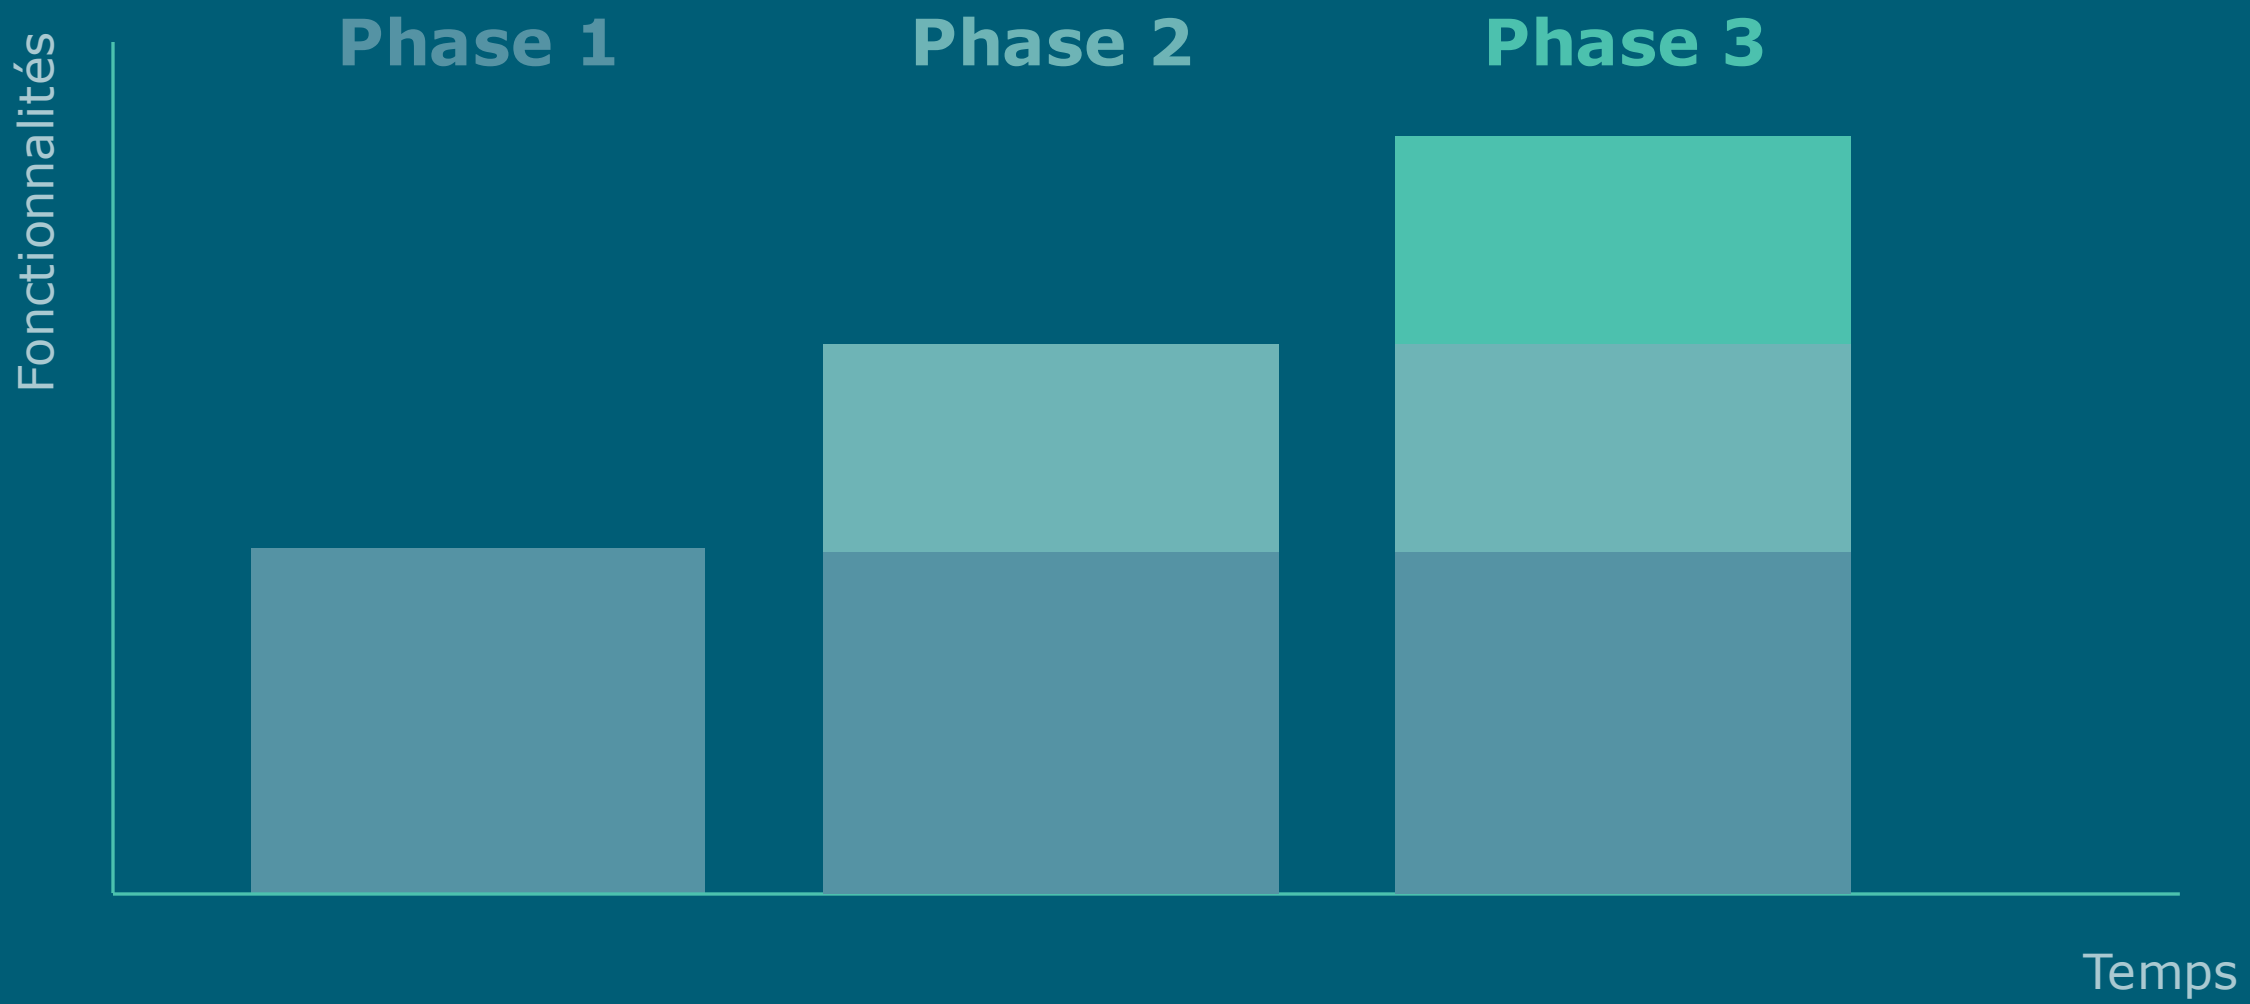

Développement de l'application

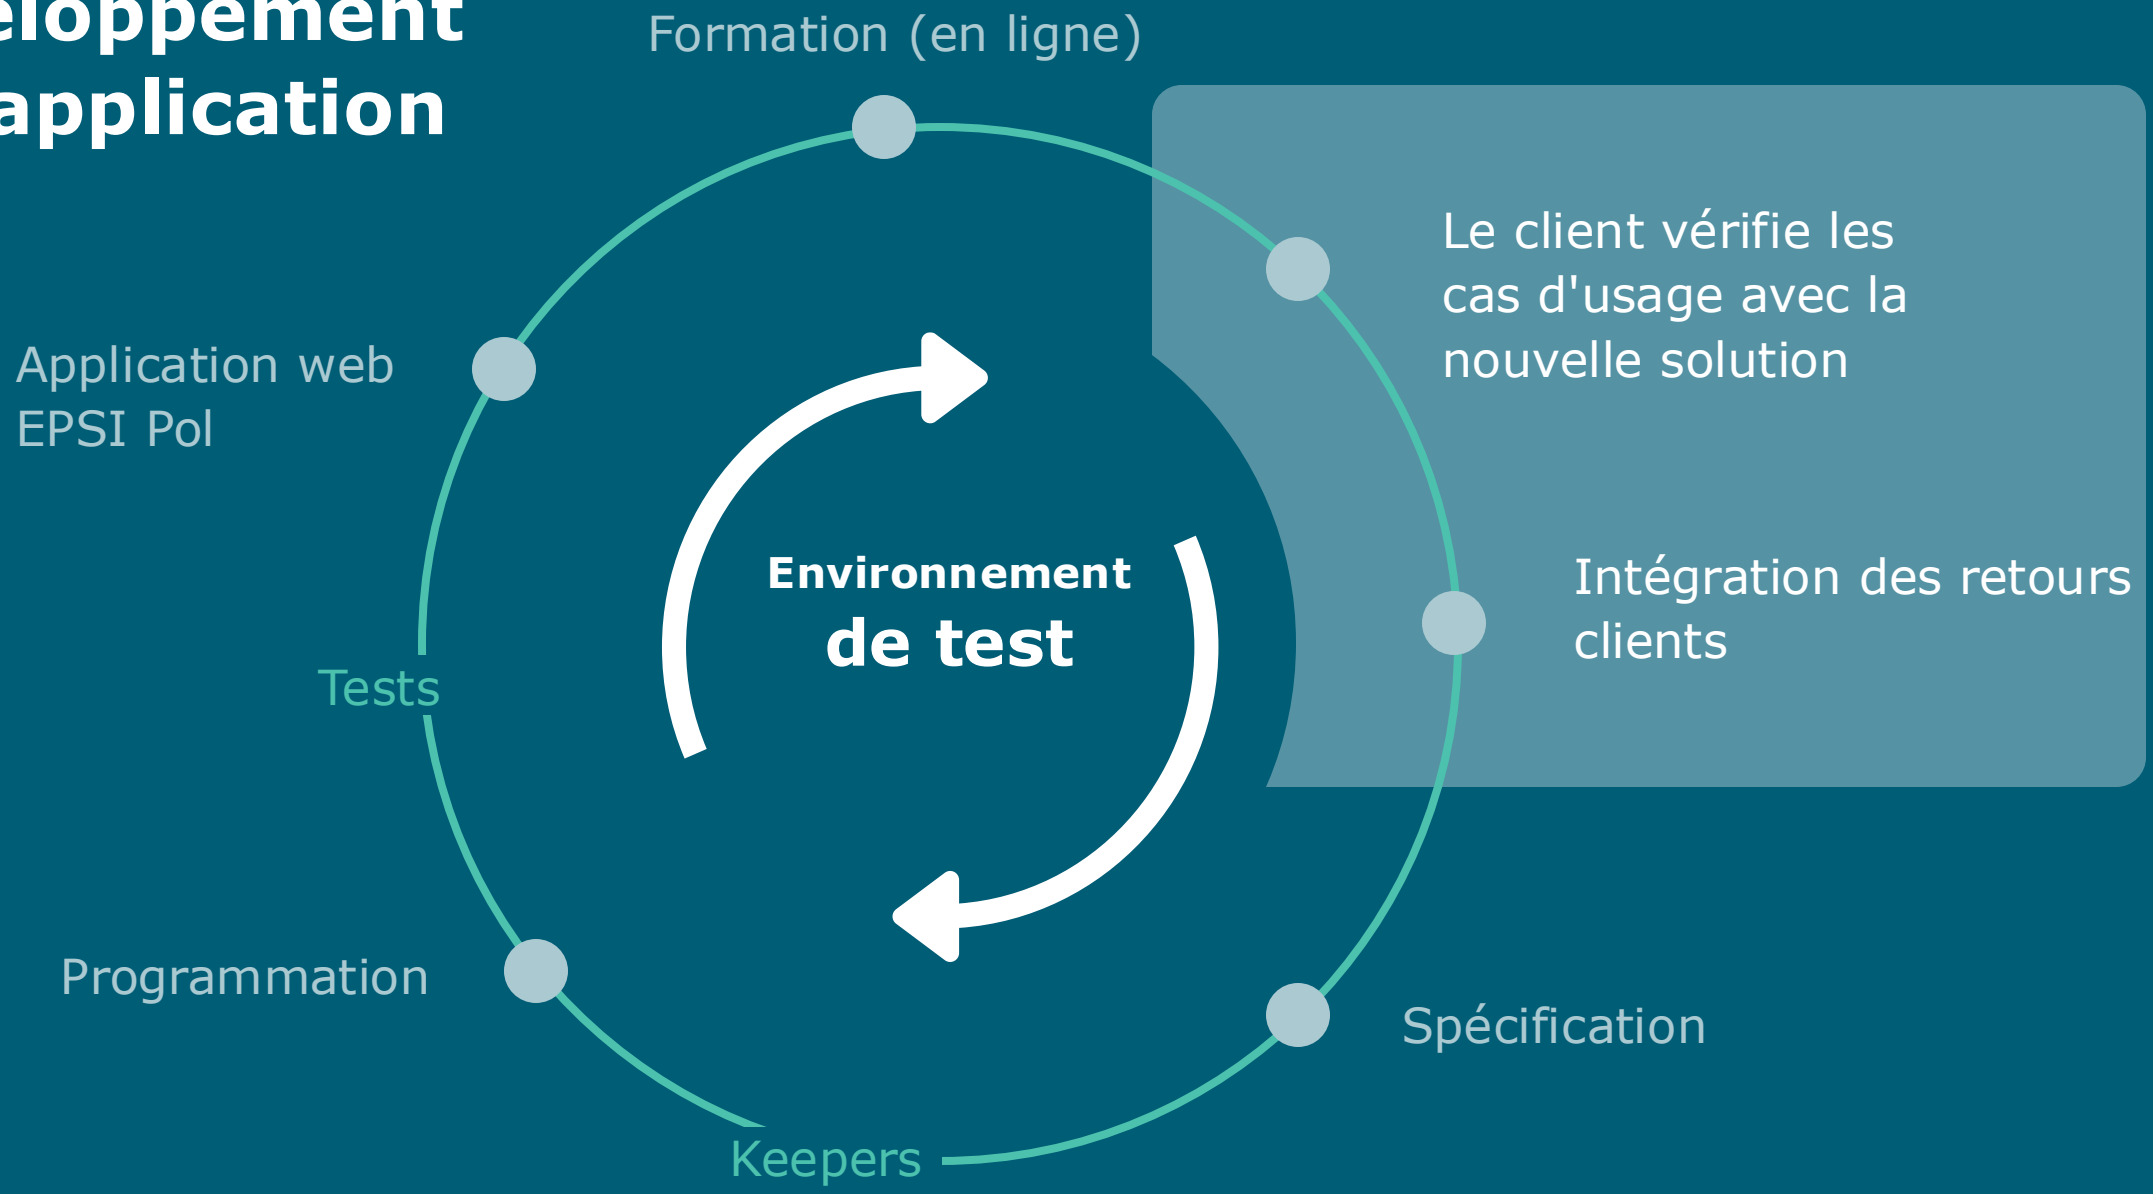

Démarche du projet

Développement planifié

4

Mise en service et déploiement

Mettre à disposition un environnement pour les tests client
Mise en service selon le plan de déploiement
Formation du personnel

3

Réalisation côté Abraxas

Démonstration en direct : aperçu d'ePOL
Développement de l'application
Intégration des retours

Réalisation côté client

Phase de test des cas d'usage
Retour du client ensuite pris en compte et intégré

2

Conception

Premières ébauches / Création du prototype ePOL / Spécifications
Planification et mise en place du système de test

1

Initialisation

Situation actuelle / Analyse
Organisation des équipes et des tâches

Déploiement selon les fonctionnalités



EPSI Pol
Processus standard sans adaptation

Phase 1



EPSI Pol
Processus standard avec exigences étendues

Phase 2



EPSI Pol
Clients avec un haut degré de personnalisation

Phase 3

Nous répondons volontiers à vos questions



Merci beaucoup

de votre attention
